Návrh DIO:
Plzeň
BD Korandova
přeložka horkovodu

Zpracoval: Basl Václav
Dne: 19. října 2026
T + 420 725 398 616
E vaclav.basl@saferoad.cz


Saferoad Restraint Systems s. r. o.
Plzeňská 666
330 21 Líně
CZECH REPUBLIC
T + 420 377 226 226, F + 420 377 226 227 > saferoad.cz

Mgr. Bohdana Benešová

Digitální podpis: 29.10.2026 09:39
Důvod podpisu: Ke stanovení č.j.:
MMP/501693/26 ze dne 29.10.2026

Situace - dotčený úsek, výstavba BD Korandova, přeložka horkovod

SAFEROAD

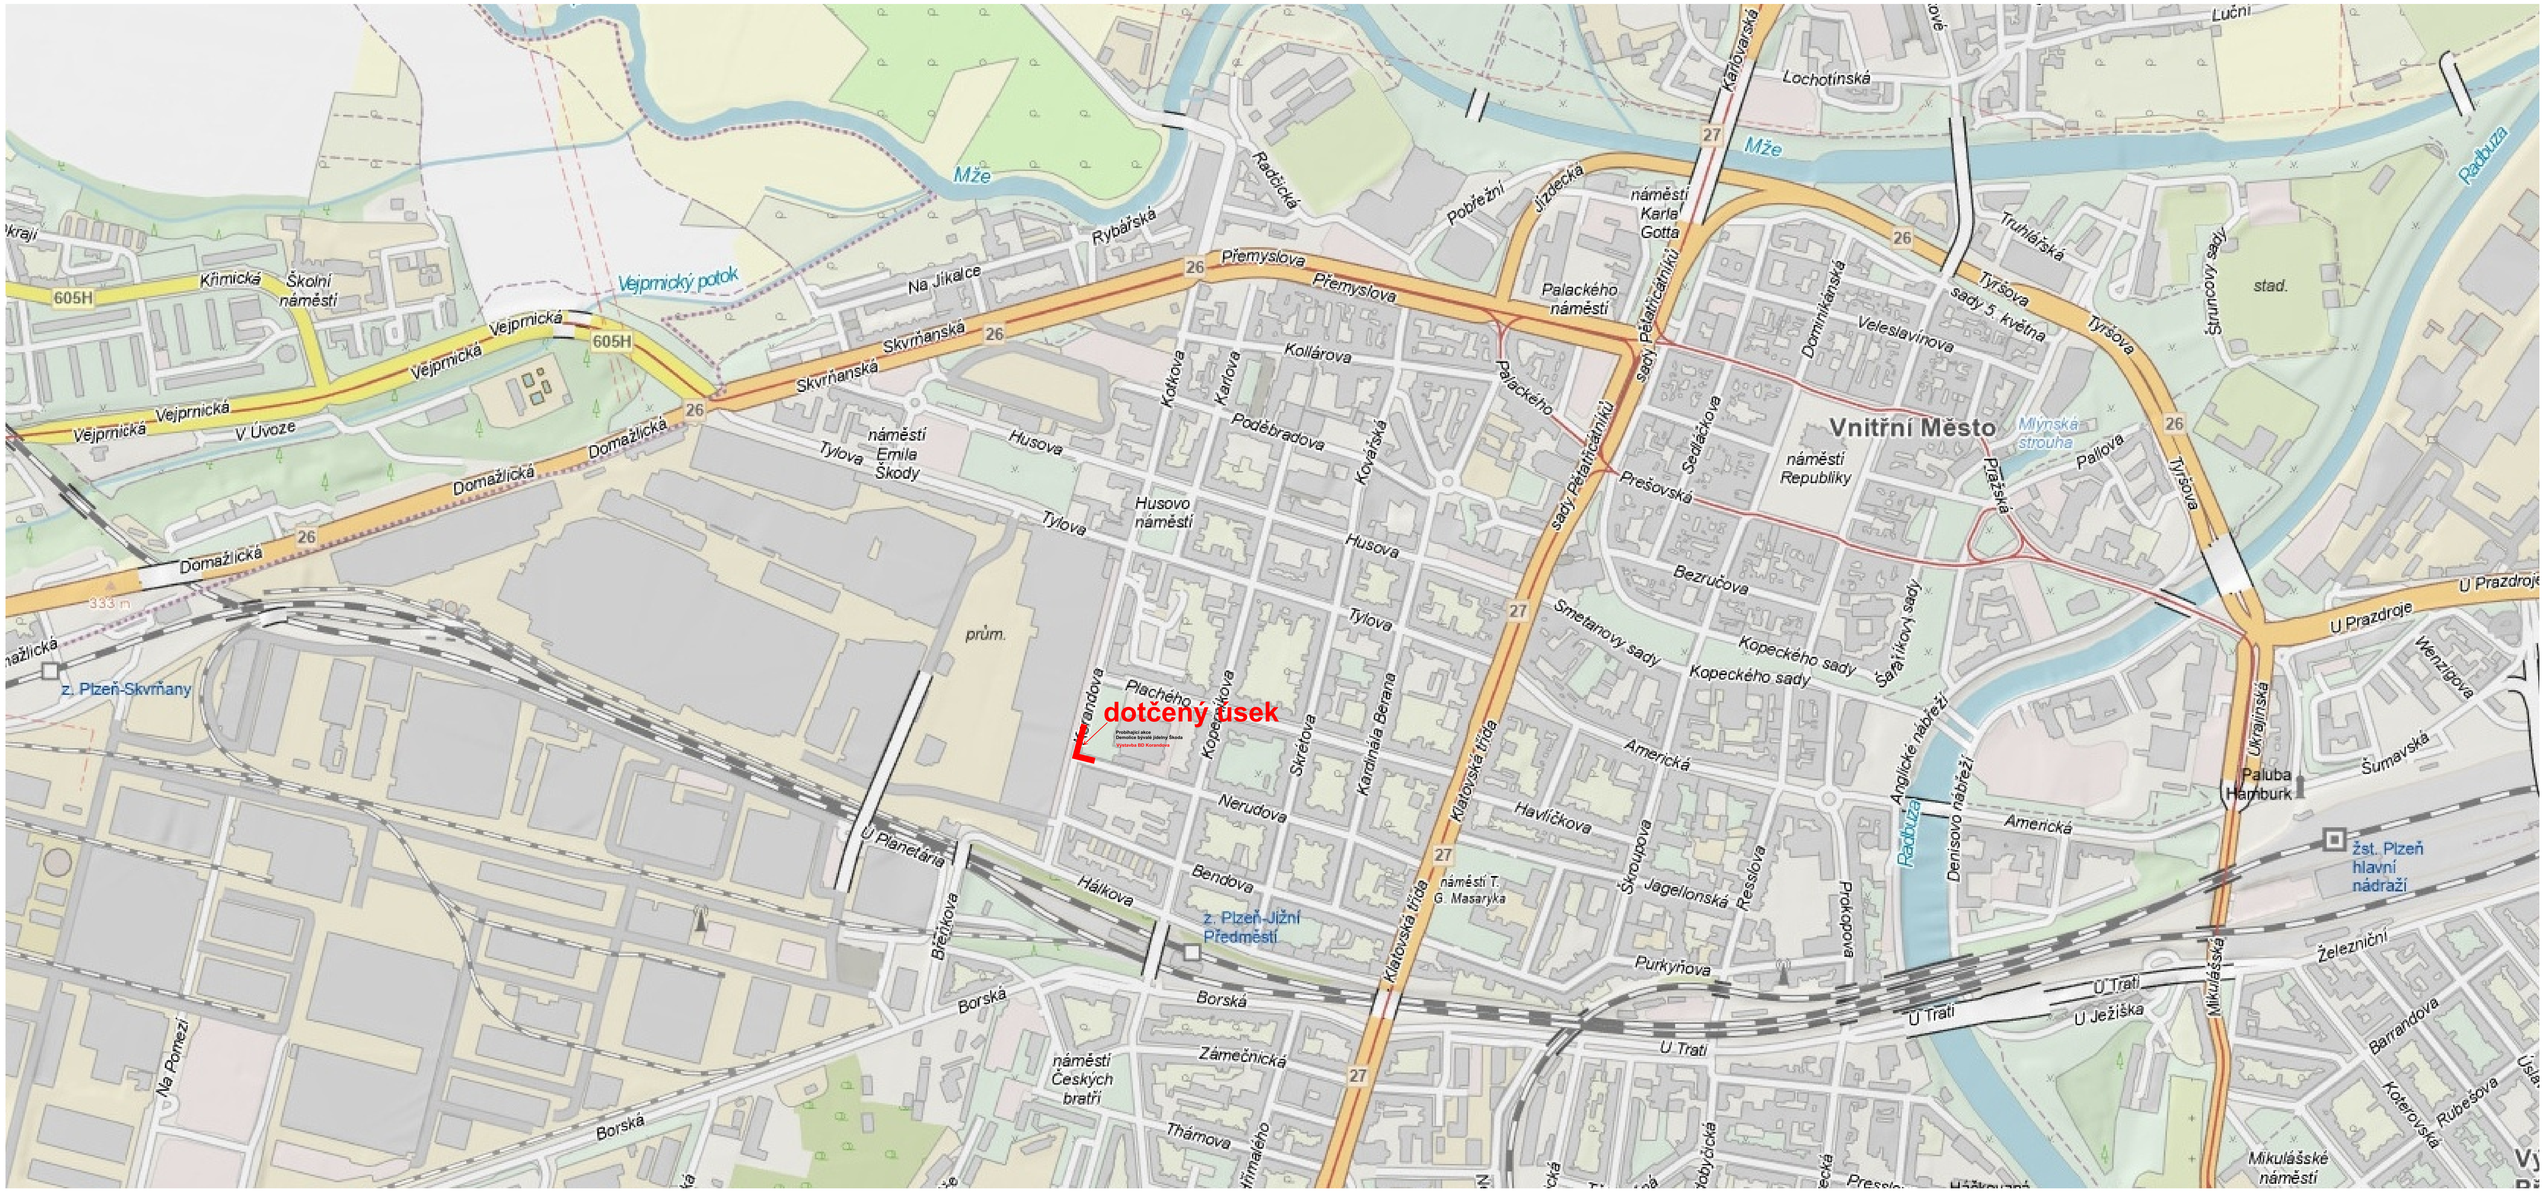


Návrh DIO - dotčený úsek, výstavba BD Korandova, přeložka horkovod

SAFEROAD®

NUTNO VČAS PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ INFORMOVAT OBYVATELE A UŽIVATELE OBLASTI!!
Při provádění nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu,
v případě potřeby bude doprava řízena řádně poučenými pracovníky
v reflexních vestách,vybaveni terči pro zastavování dopravy,
dle zákona 361/2000 Sb.!!
MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNA BEZPEČNOST PĚŠÍCH!!

SITUACE Č. 1

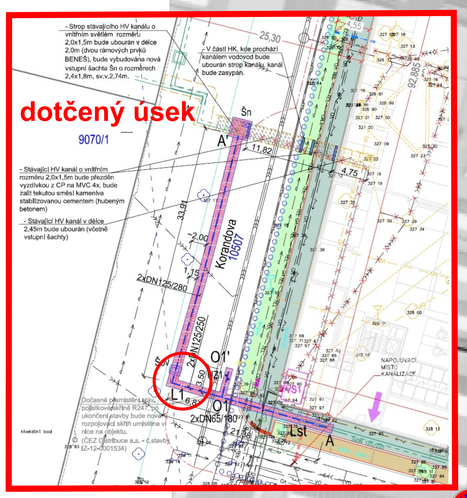


Návrh DIO - dotčený úsek, výstavba BD Korandova, přeložka horkovod

SAFEROAD®

NUTNO VČAS PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ INFORMOVAT OBYVATELE A UŽIVATELE OBLASTI!!
Při provádění nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu,
v případě potřeby bude doprava řízena řádně poučenými pracovníky
v reflexních vestách,vybaveni terči pro zastavování dopravy,
dle zákona 361/2000 Sb.!!
MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNA BEZPEČNOST PĚŠÍCH!!

SITUACE Č. 2

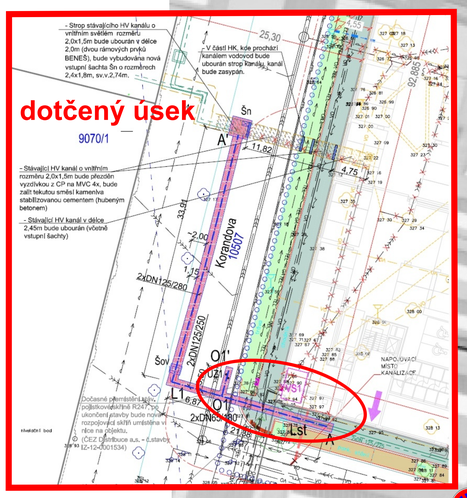

probíhající DIO v rámci akce Demolice bývalé jídelny Škoda

Probíhající akce
Demolice bývalé jídelny Škoda

Výstavba BD Korandova

C0401 Korandova
C0407 Plachého
C0408 Nerudova
C0404 Kopernikova
ÚK 0403 Korandova


Saferoad Restraint Systems s. r. o. Plzeňská 666 330 21 Líně T + 420 377 226 226 E plzen@saferoad.cz IČO: 25229761 >

Návrh DIO - dotčený úsek, výstavba BD Korandova, přeložka horkovod

SAFEROAD®

NUTNO VČAS PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ INFORMOVAT OBYVATELE A UŽIVATELE OBLASTI!!
Při provádění nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu,
v případě potřeby bude doprava řízena řádně poučenými pracovníky
v reflexních vestách,vybaveni terči pro zastavování dopravy,
dle zákona 361/2000 Sb.!!
MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNA BEZPEČNOST PĚŠÍCH!!

SITUACE Č. 3

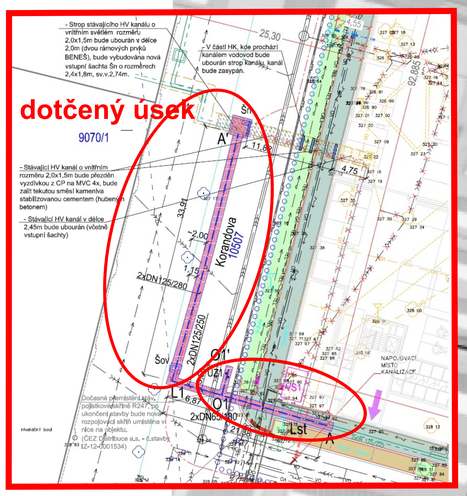

probíhající DIO v rámci akce Demolice bývalé jídelny Škoda
Probíhající akce
Demolice bývalé jídelny Škoda
Výstavba BD Korandova
C0401 Korandova
C0407 Plachého
C0408 Nerudova
C0404 Kopernikova
ÚK 0403 Korandova
POZOR
VÝJEZD VOZIDEL STAVBY
IP22
IP 13c
E13
B28
B30
Z2
B1
P2
P4
P6
P7
A15
B24b
STOP
Průjezd min. šířky 3,25m
Průchod min. 1,50m
Přístup pro zásah. vozidla
Přístup pro zásah. vozidla
Přístup pro zásah. vozidla

SAFEROAD®

Technická zpráva

Návrh DIO je vykresleno v přiložené situaci.

Jedná se o návrh DIO, a to z důvodu akce Plzeň, BD Korandova, přeložka horkovodu.

Při provádění nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu, v případě potřeby bude bezpečnost zajišťována poučenými osobami dle zákona 361/2000 Sb. a prostředky zhotovitele.

Před zahájením prací budou obyvatelé a uživatelé oblasti informováni o rozsahu prací a omezení provozu.
Bude zajištěna bezpečnost pěších.

Vyblokování parkovacích stání bude provedeno v předstihu dle rozhodnutí silničního správního úřadu ÚMO 3 Plzeň.

Harmonogram prací bude před zahájením stavby předložen správnímu úřadu.

Termín: 2026-2027

Všechny přechodné dopravní značky jsou v základním rozměru, reflexní, minimálně třídy R1. Projekt DIO vychází z Technických podmínek Ministerstva dopravy ,,Zásady dopravního značení na pozemních komunikacích" TP 65, ,,Zásady pro označování pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích" TP66 a Příručka pro označovaní pracovních místa na dálnicích a komunikacích.
