Časový harmonogram - přesun tanku M4 Sherman

Město Plzeň

Klatovská 19, Plzeň

SILBA-Elstav STAVEBNÍ SPOLEČNOST
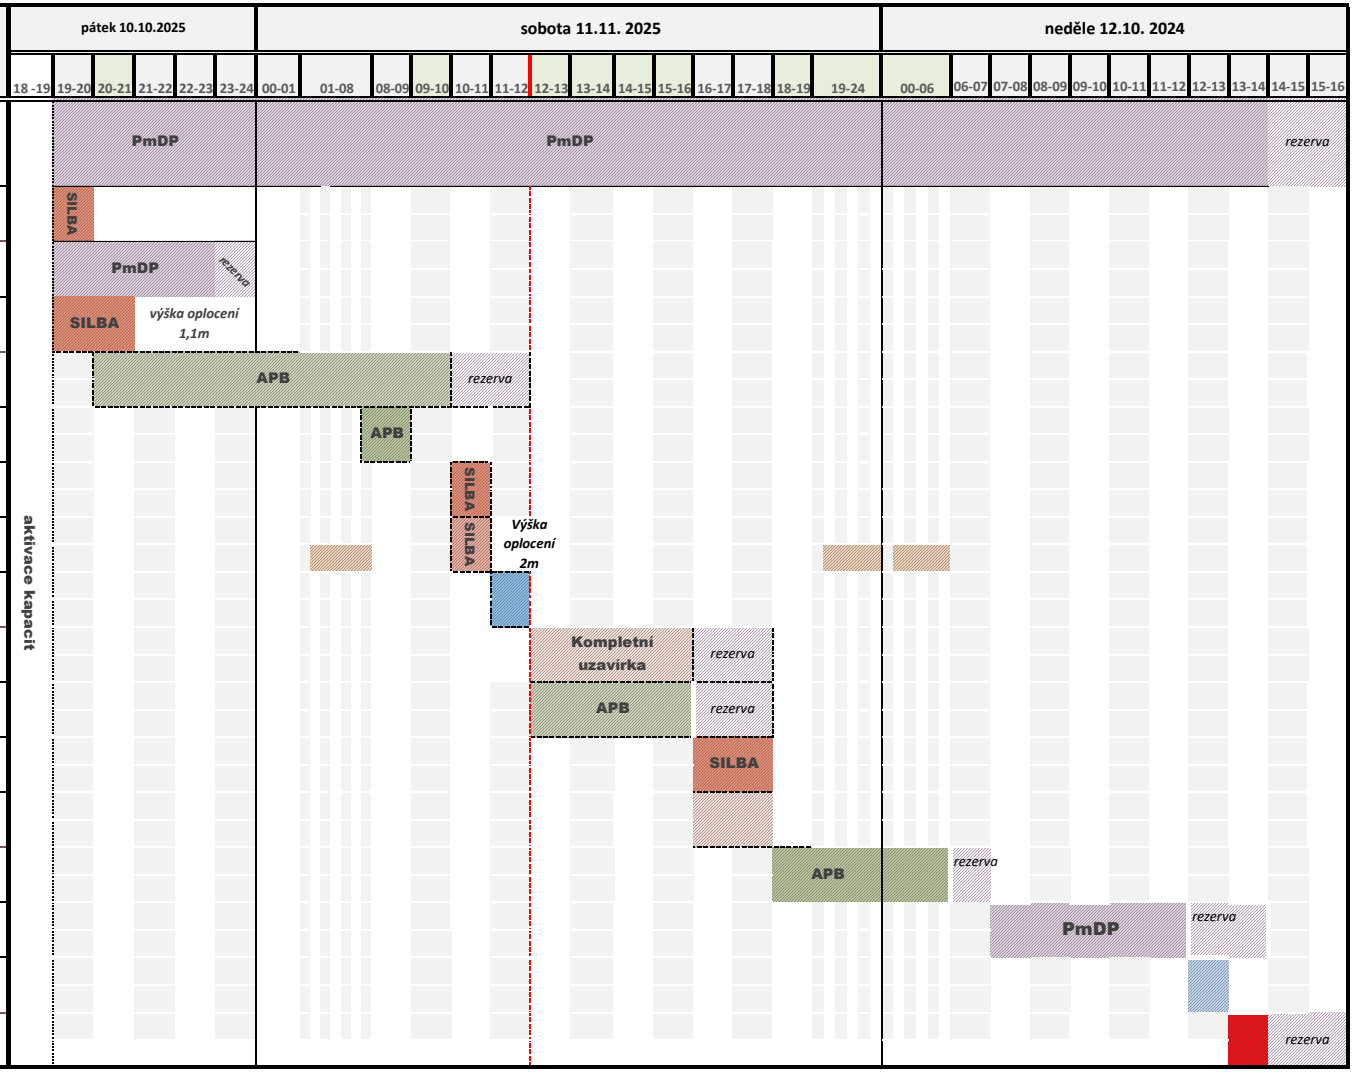
AKTIVITA	ZAHÁJENÍ činnosti	DOBA TRVÁNÍ PLÁNU	DOKONČENÍ činnosti	rezerva
zastavení tramvajové dopravy Tram č.4 v úseku Klatovská, zahájení náhradní dopravy	10.10.2025 18:00	hodin 44,00	12.10.2025 14:00	12.10.2025 +2→16:00
provedení pasportu převzaté komunikace	10.10.2025 19:00	hodin 1,00	10.10.2025 20:00	bez rezervy
demontáž horního vedení tramvajové trakce	10.10.2025 19:00	hodin 4,00	10.10.2025 23:00	10.10.2025 +1→24:00
stavba zábran pro montáž jeřábu - **ZÁBOR 1 ETAPA**	10.10.2025 19:00	hodin 2,00	10.10.2025 21:00	bez rezervy
montáž jeřábu	10.10.2025 20:00	hodin 14,00	11.10.2025 10:00	11.10.2025 +2→12:00
nájezd návěsu s tankem	11.10.2025 10:00	hodin 1,00	11.10.2025 11:00	11.10.2025 +1→ 12:00
Částečné rozebrání záboru č.1 pro průchod chodců	11.10.2025 10:00	hodin 1,00	11.10.2025 11:00	bez rezervy
Montáž záboru **ZÁBOR 2 ETAPA**	11.10.2025 11:00	hodin 1,00	11.10.2025 12:00	bez rezervy
Novinářský briefing	11.10.2025 11:00	hodin 1,00	11.10.2025 12:00	bez rezervy
Zahájení kompletní uzavírky	11.10.2025 11:00	hodin 5,00	11.10.2025 16:00	11.10.2025 +2→ 18:00
přesun tanku jeřábem na místo	11.10.2025 12:00	hodin 4,00	11.10.2025 16:00	11.10.2025 +2→ 18:00
Obnovení záboru č.1 pro demontáž jeřábu	11.10.2025 16:00	hodin 2,00	11.10.2025 18:00	bez rezervy
otevření druhého jízdního pruhu	11.10.2025 16:00	hodin 2,00	11.10.2025 18:00	bez rezervy
demontáž jeřábu	11.10.2025 18:00	hodin 12,00	12.10.2025 6:00	12.10.2025 +1→ 07:00
montáž horního vedení tramvajové trakce	12.10.2025 7:00	hodin 5,00	12.10.2025 12:00	12.10.2025 +2→ 14:00
Převzetí komunikace ŘSD	12.10.2025 12:00	hodin 1,00	12.10.2025 13:00	bez rezervy
Zahájení standardního provozu tramvají	12.10.2025 14:00	hodin v daný čas	12.10.2025 16:00	12.10.2025 +2→ 16:00
